

UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2022 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU



Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Mart/2023

İÇİNDEKİLER

1- YÖNETİCİ SUNUŞU	ii
2- GENEL DEĞERLENDİRME.....	1
2.1 MİSYON.....	1
2.2 VİZYON	1
2.3 TEMEL DEĞERLER	1
2.4 TEMEL AMAÇ ve HEDEFLER	2
2.5 YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI	4
2.6 KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM / HİZMET KAPASİTESİ	5
2.7 2022 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI / KALİTE ARTIŞI / İYİLEŞME.....	10
2.8 2022 YILI YATIRIM UYGULAMALARI	11
2.8.1 Genel Yatırım Uygulama Durumu.....	11
2.8.2 Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar.....	12
3- 2022 YILI PROJE UYGULAMALARI	12
3.1- DEVAM EDEN PROJELER.....	12
3.1.1 2020H03-151690 Kampüs Altyapısı.....	12
3.1.2 2008H03-945 Derslik ve Merkezi Birimler (Tasarım Merkezi)	15
3.1.3 2008H03-945 Derslik ve Merkezi Birimler (Eşme Meslek Yüksekokulu).....	18
3.1.4 2016H05-41320 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	20
3.1.5 2017K12-40721 İhtisaslaşma Projesi.....	21
3.1.6 2021I00-166922 Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi.....	25
3.2 TAMAMLANAN PROJELER	27
3.2.1 2021H03-168023 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	27
3.2.2 2022H03-187116 Muhtelif İşler	29
3.2.3 2022H03-168025 Yayın Alımı	36
3.2.4 2022I00-18009 Sağlık-Muhtelif İşler Projesi	37
3.2.5 2022K12-186801 Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	47
4- YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE İZLENİP DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN OLARAK ÖNERİLER.....	50
5- UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2021 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ	51
6- 2022 YILI HARCAMALARI YATIRIM UYGULAMA RAPORU.....	52

1- YÖNETİCİ SUNUŞU



Üniversitemiz, bugün sahip olduğu akademik birimleri, öğretim elemanı, öğrenci sayısı, fiziki kapasitesi ve bilimsel araştırmalarıyla; sosyal, kültürel ve sportif etkinlikleriyle yükseköğretim kurumları arasında emin adımlarla öne çıkmaktadır.

Üniversitemiz bünyesinde 14 Fakülte, 1 Enstitü, 1 Yüksekokul, 11 Meslek Yüksekokulu ile 22 Uygulama ve Araştırma Merkezi yer almaktadır. 1.286'sı lisansüstü, 17.899'u lisans ve 8.195'i ön lisans olmak üzere toplam 27.380 öğrencimiz bulunmaktadır.

863'ü akademik ve 329'u idari personel, 34 ü sözleşmeli personel, 240'ı sürekli işçi olmak üzere toplam 1.466 personelimiz ile Birlikte geleceğimizin teminatı olan gençlere hizmet etmek için var gücümüzle çalışmaktayız. Akademik ve idari personelimizle beraber amacımız, mezun olan öğrencilerimizin özgüvenini arttırıp sahada iş bulabilmelerini kolaylaştırmaktır. Öğrencilerimize artı değerler kazandırarak iş arayan değil, iş için aranan elemanlar yetiştirmeyi sağlama yönünde çalışmalar yapmaktayız.

Genç, dinamik, ulusal ve uluslararası akademik kadrosuyla, öğrenci merkezli yönetim anlayışıyla bölgenin parlayan yıldızı olan Uşak Üniversitesi; Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı kapsamında Deri, Tekstil ve Seramik alanlarında 18 Ekim 2016 tarihinde pilot üniversite olmuştur. Deri, Tekstil ve Seramik alanlarında pilot Üniversite olmamız ve stratejik planımıza bu amaçla konulan hedeflere ulaşmak için çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Bu amaçla yapılması planlanan DTS Tasarım Merkezi binasının inşasına 2021 yılında başlanılmış olup 2022 yılında da devam etmiştir. Bütün paydaşlarımızla bölgesel kalkınma özgörevini ve farklılaşmayı ortaya koymak adına işbirlikleri geliştirerek kamu kurumları, sanayi kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle Üniversite-Sanayi/Üniversite-Şehir bütünleşmesini en ileri seviyede sağlamak için gerekli adımları atıyoruz.

2022 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar ile Üniversitemize toplam 10 adet yatırım projesi izni verilmiş olup, bu projeler için 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 32.570.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

Her geçen yıl büyümekte olan Üniversitemiz, 2020-2024 dönemi Stratejik Planı ve 2022 yılı Performans Programında belirlenen hedeflere ulaşmak amacıyla, özverili çalışmaları sonucu yatırım uygulamalarını başarıyla tamamlamıştır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesine istinaden hazırlanan Üniversitemiz 2022 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine sunulur.

Prof.Dr.Ekrem SAVAŞ
Rektör

2- GENEL DEĞERLENDİRME

2.1 MİSYON

Nitelikli eğitim-öğretim faaliyetleriyle evrensel değerlere bağlı, özgüven sahibi, donanımlı Bireyler yetiştirmeyi, toplumun ve bölgenin gelişimine yönelik ihtisaslaşma alanlarında projeler üreterek sürdürülebilir kalkınmaya öncülük etmeyi görev edinmiştir.

2.2 VİZYON

Eğitim ve araştırma alanlarında mükemmelliğe önem veren, bilgi üreten, ihtisaslaşma alanında tasarım geliştiren, geleceğe yön veren girişimci Bireyler yetiştiren ve toplumsal gelişime liderlik eden Bir üniversite olmaktır.

2.3 TEMEL DEĞERLER

- ✓ **Çevik Yönetim**
Değişimlere hızlı ve etkin Bir şekilde uyum sağlayan Bir yönetim anlayışına sahiptir.
- ✓ **Farklılıklara Saygı**
Paydaşlarının değerlerine ve farklılıklarına saygılıdır.
- ✓ **Mükemmellik**
Mükemmellik kültürünü benimsemekte ve tüm süreçlerinde uygulamaktadır.
- ✓ **Kurumsal Kültür**
Çalışanların aidiyet duygusunun gelişmesine ve kurumsal kültürün yerleşmesine önem verir.
- ✓ **Bölgesel Değerler**
Bulunduğu ilin ve bölgenin tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkar.
- ✓ **Çevre Bilinci**
Çevresel zenginliklerinin farkında olup çevre bilincine sahiptir ve doğaya saygılıdır.

2.4 TEMEL AMAÇ ve HEDEFLER



Amaç 1: Eğitim-Öğretimin Kalitesini Arttırmak
Hedef 1.1 Eğitim-öğretim niteliğinin geliştirilmesi
Hedef 1.2 Uzaktan eğitim sisteminin etkinliğinin artırılması
Hedef 1.3 Lisansüstü öğretimin teşvik edilmesi ve güçlendirilmesi
Hedef 1.4 Engeli olan bireyler için gerekli düzenlemelerin yapılması
Hedef 1.5 Kalite anlayışı doğrultusunda kurumsal yapının iyileştirilmesi
Hedef 1.6 Fiziki altyapı ile bilişim altyapısının geliştirilmesi

Amaç 2: Yenileşim ve Girişimcilik Odaklı AR-GE Faaliyetlerini Güçlendirmek
Hedef 2.1 Üniversitede girişimciliğin geliştirilmesi
Hedef 2.2 Nitelikli ve etkin araştırma yapabilme kapasitesinin artırılması
Hedef 2.3 Disiplinler arası araştırma faaliyetlerinin ve projelerinin artırılması
Hedef 2.4 Bilimsel çalışma ve sanatsal etkinlik sayısının artırılması
Hedef 2.5 Araştırma etkinliğinin geliştirilmesi

Amaç 3: Deri, Tekstil ve Seramik Alanında Bölgesel Kalkınmayı Sürdürülebilir Kılmak
Hedef 3.1 Üniversite Sektör İşbirliğinin Artırılması
Hedef 3.2 Deri, tekstil ve seramik tasarım merkezinin faaliyete geçirilmesi ile tasarım ve teknoloji çalışmalarının artırılması
Hedef 3.3 Akademik yetkinliğin artırılması

Amaç 4: Ulusal ve Uluslararası Tanınırlığının ve Tercih Edilebilirliği Arttırmak
Hedef 4.1 Üniversitemizin ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığının artırılması ve imajının geliştirilmesi
Hedef 4.2 Yurtiçinde ve yurtdışında üniversiteler ve araştırma kurumları ile yapılan iş Birliği sayısının artırılması
Hedef 4.3 Üniversitemizin öğretim programlarının, faaliyet alanlarının duyurulması ve tanıtılmasının sağlanması

Amaç 5: Toplumsal Katkı Sağlamaya Yönelik İş Birliklerini ve Sosyal Sorumluluk Hizmetleri Arttırmak
Hedef 5.1 Küresel değişim dinamikleri çerçevesinde topluma katkının artırılması
Hedef 5.2 Mezunlar ile daha etkin çalışmaların yapılması
Hedef 5.3 Hayat boyu öğrenme olanaklarının artırılması
Hedef 5.4 Dış Hekimliği Fakültesinin altyapısının ve koruyucu dış hekimliği hizmetlerinin iyileştirilmesi
Hedef 5.5 Sürdürülebilir çevre anlayışının geliştirilmesi

2.5 YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda (II) sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin (A) *Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri* içerisinde sayılmış olup merkezi yönetim içerisinde yer alan özel bütçeli Bir kurumdur. Gelirlerimiz:

A) Özel Bütçe

- Hazine Yardımı
- Öz Gelirler

B) Döner Sermaye

C) Bütçe Dışı Kaynak

- TÜBİTAK
- AB Fonları
- Farabi- Mevlana Programı Destekleri
- Kalkınma Ajansı Destekleri
- SAN-TEZ

Üniversitemize 2022 Yılı Yatırım Programı ile 32.570.000,00 TL yatırım ödeneği tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin; 32.500.000,00 TL'si hazine yardımı, 24.000,00 TL'si döner sermaye payı ve 46.000,00 TL'si tezsiz yüksek lisans geliri olarak tahsis edilmiştir.

Yıl içerisinde 7.414 sayılı Kanun ile 10.000.000,00 TL ek bütçe verilmiş, 27.530.000,00 TL likit karşılığı ve 344.100,00 TL gelir fazlası karşılığı olmak üzere ödenek ekleme işlemleri yapılmıştır. Ayrıca 11.7000.000,00 TL yedek ödenekten aktarma işlemi yapılmıştır. Yapılan aktarma ve ekleme işlemlerinden sonra Üniversitemiz yatırım ödeneği 2022 yılı sonu itibari ile 82.144.100,00 TL olmuştur.

2022 yılı yatırım projelerinin finansman kaynakları aşağıdaki tabloda ayrıntılı Bir şekilde gösterilmiştir.

Proje No	Proje Adı	ÖZEL BÜTÇE		Yedek Ödenek	7414 sayılı Kanunla Verilen Ek Bütçe	Likit	Gelir Fazlası	Projeler Arası Aktarım		Toplam Kaynak
		HAZİNE	ÖZ GELİR					Düşülen	Eklenen	
2020H03-151690	Kampüs Altyapısı	2.000.000	0	0	0	2.500.000	0	0	0	4.500.000
2008H03-945-151708	Tasarım Merkezi	8.000.000	0		0	8.000.000			60.000	16.060.000
2008H03-945-190860	Eşme Meslek Yüksekokulu	0	0	5.200.000	0	0	0	0	0	5.200.000
2016H05-41320	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000
2022H03-187108	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	200.000	0	0	0	0	0	60.000	2.000.000	2.140.000
2022H03-187116	Muhtelif İşler (Eğitim Sektörü)	2.500.000	0	0	10.000.000	6.530.000	344.100	2.750.000	0	16.624.100
2022H03-187114	Yayın Alımı	1.000.000	0	0	0	0	0	0	750.000	1.750.000
2022I00-180009	Muhtelif İşler (Sağlık Sektörü)	3.200.000	0	0	0	0	0	0	0	3.200.000
2021I00-166922	Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi	10.600.000	0	6.500.000	0	10.500.000	0	0	0	27.600.000

2022K12-186801	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	0	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000
2017K12-40721	Deri, Tekstil ve Seramik Sektörlerinde İhtisaslaşma Projesi	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
GENEL TOPLAM		32.500.000	70.000	11.700.000	10.000.000	27.530.000	344.100	2.810.000	2.810.000	82.144.100

2.6 KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM / HİZMET KAPASİTESİ

Üniversitemizde 14 Fakülte, 1 Enstitü, 1 Yüksekokul ve 11 Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır.

FAKÜLTELER

- ✓ Diş Hekimliği Fakültesi
- ✓ Eğitim Fakültesi
- ✓ Fen Edebiyat Fakültesi
- ✓ Güzel Sanatlar Fakültesi
- ✓ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
- ✓ İletişim Fakültesi
- ✓ İslami İlimler Fakültesi
- ✓ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
- ✓ Mühendislik Fakültesi
- ✓ Sağlık Bilimleri Fakültesi
- ✓ Spor Bilimleri Fakültesi
- ✓ Tıp Fakültesi
- ✓ Uygulamalı Bilimler Fakültesi
- ✓ Ziraat Fakültesi

MESLEK YÜKSEKOKULLARI

- ✓ Adalet Meslek Yüksekokulu
- ✓ Banaz Meslek Yüksekokulu
- ✓ Eşme Meslek Yüksekokulu
- ✓ Karahallı Meslek Yüksekokulu
- ✓ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- ✓ Sivaslı Meslek Yüksekokulu
- ✓ Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu
- ✓ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
- ✓ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
- ✓ Ulubey Meslek Yüksekokulu
- ✓ Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu

ENSTİTÜ

- ✓ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

YÜKSEKOKUL

- ✓ Yabancı Diller Yüksekokulu

Üniversitemiz merkezde; Bir Eylül ve Diş Hekimliği, ilçelerde; Banaz, Ulubey, Karahallı, Sivaslı ve Eşme yerleşkelerinde eğitim öğretim faaliyetlerini yürütmektedir. Üniversitemiz yerleşkeleri, toplam 1.299.341,86 metrekare açık alana kurulmuştur. Uşak Üniversitesi yerleşkelerindeki alanların dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

UŞAK ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKE ALANLARI						
Yerleşke Adı	Kapalı Alan Miktarı (metrekare)			Toplam Alan (metrekare)		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Bir Eylül Kampüsü	164.313	164.313	164.313	990.259,14	990.259,14	990.259,14
Diş Hekimliği Fakültesi	4.377	4.377	4.377	8.482,72	8.482,72	8.482,72
İlçeler	19.234	19.234	19.234	300.600	300.600	300.600
TOPLAM	188.049	188.049	188.049	1.299.341,86	1.299.341,86	1.299.341,86

1 Eylül Yerleşkesinde bulunan binalar sırasıyla şu şekildedir; Mühendislik Fakültesi, Öğrenci Sosyal Merkezi Kompleksi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Merkezi Kütüphane, Öğrenci Yaşam Merkezi, Öğrenci Sosyal Merkezi Kompleksi(Çarşı), Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sosyal Eğitim ve Kültür Merkezi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi B Blok, Merkezi Derslik D2 Blok, Merkezi Akademik Bloklar (MA1, MA2, MA3, MB4), Kapalı Spor Salonu ve Yarı Olimpik Yüzme

Havuzu, Bilimsel Araştırmalar Merkezi Analiz Laboratuvarı, Merkezi İdari Blok, Merkezi Derslik (Tüprag Bloğu), Rektörlük Binası ve Kongre Binası.

Şehir merkezinde Diş Hekimliği Fakültesi yerleşkesi bulunurken, Banaz yerleşkesinde Banaz Meslek Yüksekokulu, Eşme yerleşkesinde Eşme Meslek Yüksekokulu, Karahallı yerleşkesinde Karahallı Meslek Yüksekokulu, Ulubey yerleşkesinde Ulubey Meslek Yüksekokulu, Sivaslı yerleşkesinde Sivaslı Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır.

Üniversitemiz kapalı mekânlarının hizmet alanlarına göre detaylı dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Uşak Üniversitesi Yerleşkelerindeki Alanların Dağılımı (metrekare)								
Enstitü, Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksek Okulları ve Tüm Birimler	İdari Binalar	Derslik	Laboratuvar	Kantin /Kafe vb.	Lojman	Açık Spor Tesisler	Kapalı Spor Tesisleri	Toplam
Rektörlük Hizmet Binası ve Kongre ve Kültür Merkezi	23.773							23.773
Banaz Meslek Yüksek Okulu		6.000						6.000
Eşme Meslek Yüksek Okulu		3.265						3.265
Karahallı Meslek Yüksek Okulu		4.890						4.890
Ulubey Meslek Yüksek Okulu		1.579				1.140		2.719
Sivaslı Meslek Yüksek Okulu		2.360						2.360
Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Halil Kaya Gedik Bloğu)		3.775		200				3.975
Eski Yemekhane				1.500				1.500
Güzel Sanatlar Fakültesi		8.832		234				9.066
Öğrenci Sosyal Merkezi Kompleksi (Çarşı)				2.222				2.222
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (B BLOK)	1.226							1.226
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (D1 Blok)		5.752						5.752
Fen Edebiyat Fakültesi (D2 Blok)		6.464						6.464
Merkezi Akademik Bloklar, MA1, MA2, MA3,	12.947							12.947
Sosyal Bilimler ve Teknik Bilimler MYO		6.351						6.351
Kapalı Spor Salonu ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu							7.404	7.404
Bilimsel Analiz ve Teknolojik Araştırmalar Laboratuvarı			3.550					3.550
Sosyal Tesisler					2.161			2.161
Merkezi Kütüphane		10.300						10.300
Merkezi İdari Blok	6.837							6.837
Ana Giriş Kapısı	71							71
Tarihi Bina Restorasyonu	538							538
Atık Su Arıtma Tesisi	625							625
Eğitim Fakültesi (Tüprag Binası)		7.162						7.162
Spor Bilimleri Fakültesi						7.140	8.040	15.180
Öğrenci Yaşam Merkezi				15.756				15.756
Teknik Bilimler Fakültesi (Mühendislik Fakültesi)		9.028						9.028
Kapalı Halı Saha ve Tenis Kortları						2.775	3.230	6.005
İslami İlimler Fakültesi		5.264		206				5.470
Diş Hekimliği Fakültesi		4.377						4.377

Su Deposu	450							450
Cami	500							500
Deney Hayvanları Etik Kurulu		125						125
Toplam	46.967	85.524	3.550	20.118	2.161	10.055	18.674	188.049

Uşak Üniversitesi'nin mülkiyetinde 20 adet taşıt bulunmaktadır. Taşıtların cinsleri ve sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Sıra No	Taşıtın Cinsi	Bütçe	Döner Sermaye + Diğer	Genel Toplam
T02	Binek otomobil	5	4	9
T03	Station-Wagon	1	0	1
T05	Minibüs (Sürücü dâhil en fazla 15 kişilik)	1	2	3
T07	Pick-up (Kamyonet, şoför dâhil 3 veya 6 kişilik)	2	0	2
T08	Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için şoför dâhil 3 veya 6 kişilik)	1	0	1
T10	Midibüs (Sürücü dâhil en fazla 26 kişilik)	1	2	3
T12	Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 Kg.	1	0	1
	Toplam	12	8	20

Kütüphane kaynaklarımız aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

KAYNAK TÜRÜ	Koleksiyona 2022 Yılı İçinde Katılan Kaynak Sayısı (Adet)	Mevcut Koleksiyon (Adet)
Kitap (Basılı)	2.440	83.343
DVD/VCD	-	30
Tez (Basılı)	154	1.934
Sürelî Yayın (Basılı)	124	3.892
E-Kaynak (Veri Tabanı)	20	73

Bilgi ve teknoloji kaynaklarımız aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Uşak Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Kaynakları			
Masaüstü Bilgisayar, Kasalar ve Diğer Bilgisayarlar	3972	Fotokopi Makinesi	88
Dizüstü Bilgisayar	673	Ofset Baskı Makineleri	10
Tablet Bilgisayar	61	Kameralar	526
Thin Client	84	Optik Mikroskoplar	150
Baskı Makinası	6	Elektron Mikroskopları	1
Evrak İmha Makinesi	41	Plotter Yazıcı	1
Faks Makinesi	13	Projeksiyon	376
Fotoğraf Makinesi	60	Tarayıcılar	118
Yazıcılar	838	Televizyon	144

Sunucular	98	Tepegöz	1
Müzik Setleri	80	Yazı Tahtaları	472

2022-2023 eğitim-öğretim yılında 863 akademik personel, 329 idari personel, 34 sözleşmeli personel ve 240 sürekli işçi olmak üzere toplam 1.466 personel görev yapmaktadır. 2022 yılında Üniversitemizde görev yapan personelin %59'u akademik personel, %23'ü idari personel, %2 si sözleşmeli personel ve %16'sı sürekli işçi personelden oluşmaktadır.

Akademik personel unvana göre boş/dolu kadro sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

ÜNVAN	Dolu	Tam Zamanlı	Yarı Zamanlı
Profesör	95	95	-
Doçent	95	95	-
Dr. Öğr. Üyesi	278	-	278
Öğretim Görevlisi	214	-	214
Araştırma Görevlisi	181	-	181
TOPLAM	863	190	673

İdari personel unvana göre boş/dolu kadro sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

İdari Personel Sayısı Dağılımı			
Sınıfı	Dolu	Boş	Toplam
Genel İdari Hizmetler Sınıfı	253	163	416
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	15	18	33
Teknik Hizmetler Sınıfı	45	45	90
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	2	2	4
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	14	4	18
TOPLAM	329	232	561

Sözleşmeli personel unvana göre boş/dolu kadro sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Sözleşmeli Personel Sayısı Dağılımı			
Pozisyon	Dolu	Boş	Toplam
Büro Personeli	9	7	16
Mühendis	4	1	5
Mimar	1	1	2
Tekniker	2		2
Teknisyen	3	1	4
Spor Uzmanı	1	1	2
Psikolog		1	1
Kütüphaneci	1	1	2
Destek Personeli	4	21	25

Hemşire	3		3
Sağlık Teknikeri	4	1	5
Diğer Sağlık Personeli	2		2
Koruma ve Güvenlik Görevlisi		7	7
Diyetisyen		1	1
TOPLAM	34	43	77

İşçi personelin boş/dolu kadro sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Çalıştıkları Pozisyonlara Göre			
	Dolu	Boş	Toplam
Sürekli İşçiler	240	16	256
Vizeli Geçici İşçiler (adam/ay)	-	-	-
Vizesiz İşçiler (3 Aylık)	-	-	-
TOPLAM	240	16	256

Üniversitemizde 2022 yılında 27.380 öğrenci eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmiştir. Öğrencilerimizin dağılımı aşağıdaki tablodaki gibidir.

Eğitim- Öğretim Yılı	Ön Lisans			Lisans			Lisansüstü			GENEL TOPLAM
	E	K	Toplam	E	K	Toplam	E	K	Toplam	
2022-2023	4.293	3.902	8.195	8.745	9.154	17.899	721	565	1.286	27.380

Üniversitemizdeki öğrencilerin ön lisans prgramlarına göre dağılımı aşağıdaki tablodaki gibidir.

Program Türü	Birimin Adı	I. Öğretim			II. Öğretim			Toplam		
		Erkek	Kadın	Toplam	Erkek	Kadın	Toplam	Erkek	Kadın	Toplam
ÖN LİSANS PROGRAMLARI	Adalet MYO	159	257	416	181	196	377	340	453	793
	Banaz MYO	443	343	785	1	1	2	444	344	788
	Eşme MYO	253	351	604	0	0	0	253	351	604
	Karahallı MYO	170	64	234	0	0	0	170	64	234
	Sağlık Hizmetleri MYO	402	812	1214	269	404	673	671	1216	1887
	Sivash MYO	125	95	220	63	38	101	188	133	321
	Sivil Havacılık MYO	144	89	233	55	65	120	199	154	353
	Sosyal Bilimler MYO	414	344	758	282	171	453	696	515	1211
	Teknik Bilimler MYO	857	120	977	0	0	0	857	120	977
	Ulubey MYO	153	361	514	15	140	155	168	501	669
	Uzaktan Eğitim MYO	277	51	328	0	0	0	277	51	328
	Ön Lisans Toplam	3397	2887	6284	866	1015	1881	4293	3902	8195

Üniversitemizdeki öğrencilerin lisans prgramlarına göre dağılımı aşağıdaki tablodaki gibidir.

Program Türü	Birimin Adı	I. Öğretim			II. Öğretim			Toplam		
		Erkek	Kadın	Toplam	Erkek	Kadın	Toplam	Erkek	Kadın	Toplam
LİSANS PROGRAMLARI	Diş Hekimliği Fakültesi	208	291	499	0	0	0	208	291	499
	Eğitim Fakültesi	684	1455	2139	20	33	53	704	1488	2192
	Fen Edebiyat Fakültesi	1132	1736	2868	399	469	868	1531	2205	3736
	Güzel Sanatlar Fakültesi	55	147	202	0	0	0	55	147	202
	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	592	746	1338	279	176	455	871	922	1793
	İletişim Fakültesi	774	663	1437	676	438	1114	1450	1101	2551
	İslami İlimler Fakültesi	292	466	758	188	244	432	480	710	1190
	Mimarlık ve Tasarım Fakültesi	162	150	312	0	0	0	162	150	312
	Mühendislik Fakültesi	745	220	965	160	19	179	905	239	1144
	Sağlık Bilimleri Fakültesi	105	258	363	22	9	31	127	267	394
	Sağlık Yüksekokulu	251	393	644	39	34	73	290	427	717
	Spor Bilimleri Fakültesi	560	179	739	173	43	216	733	222	955
	Tıp Fakültesi	256	368	624	0	0	0	256	368	624
	Uygulamalı Bilimler Fakültesi	158	168	326	0	0	0	158	168	326
	Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu	372	243	615	87	37	124	459	280	739
	Ziraat Fakültesi	356	169	525	0	0	0	356	169	525
	Lisans Toplam	6702	7652	14354	2043	1502	3545	8745	9154	17899

2.7 2022 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLenen VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI / KALİTE ARTIŞI / İYİLEŞME

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile verilen yatırım ödeneklerinin etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak harcanmasında azami özen gösterilmiş olup, bu ilkeler doğrultusunda gerekli tedbirler alınmıştır.

Bu dönemde;

- 2021 yılında 188.049 m2 olan kapalı alanımız 2022 yılında da aynı kalmıştır. Kapalı alanlarımızda kapasite artışı olmamıştır.
- Tasarım Merkezi Binası yapım işine 31 Mayıs 2021 tarihinde başlanılmıştır. İnşasına 2022 yılında da devam edilmiş ve 2023 mali yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.
- Peyzaj ve altyapı çalışmalarına 2022 yılında da devam edilmiştir.
- 2022 yılı sonu itibari ile kütüphanemizdeki kitap sayısı 83.343'e çıkmıştır.
- Birimlerin makine-teçhizat, bilgisayar yazılım ve donanım vb. ihtiyaçları karşılanmıştır.
- Fakülte ve Meslek Yüksekokullarında tadilat işleri yapılmıştır.

- Üniversitemizde yeni açılan Birimler ile mevcut Birimlerimizin ihtiyaç duyduğu büro mefruşatı donanımları alınmıştır.

2.8 2022 YILI YATIRIM UYGULAMALARI

2.8.1 Genel Yatırım Uygulama Durumu

Üniversitemize 2022 Yılı Yatırım Programı ile 32.570.000,00 TL ödenek verilmiştir. Yıl içinde 49.574.100,00 TL ödenek eklenmiştir. Eklenen bu tutarın 10.000.000,00 TL'si 7414 sayılı Kanunla verilen Ek Bütçe, 27.530.000,00 TL'si likit karşılığı, 344.100,00 TL'si gelir fazlası karşılığı olarak eklenmiştir. 2022 yıl sonu ödeneği 82.144.100,00 TL olmuştur. Bu ödeneğin 46.697.777,00 TL'si harcanmıştır. Gerçekleşme oranı %56,85 olmuştur.

Yatırım ödeneklerinin kullanılmasında gerek bütçe tertibi gerekse proje ödeneği bazında ödenek üstü harcama yapılmamıştır.

Sermaye giderlerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

KOD	AÇIKLAMA	KBÖ	EKLENEN/DÜŞÜLEN ÖDENEK	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	HARCAMA ORANI (%)
06.01	MAMUL MAL ALIMLARI	7.580.000	5.987.108	13.567.108	10.961.799	80,80
06.03	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	380.000	1.740.000	2.120.000	2.074.086	97,83
06.05	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	23.800.000	34.700.000	58.500.000	26.026.574	44,49
06.06	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	10.000	226.892	236.892	232.271	98,05
06.07	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	800.000	6.920.100	7.720.100	7.403.045	95,89
06	SERMAYE GİDERLERİ	32.570.000	49.574.100	82.144.100	46.697.777	56,85

2022 Yılı Yatırım Programında, Üniversitemizin eğitim sektöründe 6, sağlık sektöründe 2 ve teknolojik araştırma sektöründe 2 projesi yer almaktadır. Projelerin sektörel bazda ödenekleri ve gerçekleşme oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

SEKTÖR	PROJE SAYISI	2022 YILI PROGRAM ÖDENEĞİ	2022 YILI REVİZELİ ÖDENEK	2022 YILI GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
Eğitim	6	16.700.000,00	49.274.100,00	34.740.393,00	70,50
Sağlık	2	13.800.000,00	30.800.000,00	9.887.384,00	32,10
Tek. Arş.	2	2.070.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	100,00
TOPLAM	10	32.570.000,00	82.144.100,00	46.697.777,00	56,85

2.8.2 Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'ndaki ihale sürecine ilişkin sürelerin uzun olması sonucu ihalelerin geç sonuçlanması, yapım ve alım işlerinin zamanında tamamlanamaması.
- Döviz kurundaki dalgalanmalar ve fiyat istikrarının sağlanamaması ihale sürecinin uzun sürmesi nedeniyle isteklileri risk almaktan kaçınmaya itmekte, maliyet ve uygun fiyat hesabının belirlenmesinde sorunlara yol açmaktadır.
- Sözleşmenin imzalanamaması ya da ihalenin iptal edilmesi durumlarının oluşması hallerinde süre yönünden yeni Bir ihaleye çıkılması özellikle yaklaşık maliyetin ifşa edilmiş olmasında etkisi ile proje revizyonları vb. nedenlerle daha uzun sürmektedir.
- Yatırımlar için yeterli ödeneğin verilmemesi.
- Yıl içerisinde yeni projelerin programa alınması ve proje parametrelerinde değişiklik yapılması gibi taleplerin uzun sürmesi nedeniyle talepler yeterince karşılanamamaktadır.

3- 2022 YILI PROJE UYGULAMALARI

3.1- DEVAM EDEN PROJELER

2022 yılında tamamlanamayıp 2023 yılında da devam edecek olan yatırım projelerimiz aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

PROJE NO	SEKTÖR	PROJE ADI	PROJE SAHİBİ
2020H03-151690	Eğitim	Kampüs Altyapısı	Uşak Üniversitesi
2008H03-945	Eğitim	Derslik ve Merkezi Birimler	Uşak Üniversitesi
2016H05-41320	Eğitim	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Uşak Üniversitesi
2017K12-40721	Tek. Arş.	Deri, Tekstil ve Seramik Sektörlerinde İhtisaslaşma Projesi	Uşak Üniversitesi
2021I00-166922	Sağlık	Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi	Uşak Üniversitesi

3.1.1 2020H03-151690 Kampüs Altyapısı


Söz konusu proje kapsamında Üniversitemize 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2.000.000,00 TL ödenek verilmiştir. Projeye 2.500.000,00 TL likit karşılığı ödenek eklenmiştir. Projenin 2022 yıl sonu ödeneği 4.500.000,00 TL'dir. Bu ödeneğin 1.750.377,00 TL'si harcanmıştır. Projenin nakdi gerçekleşme oranı %38,90'dır. 2020H03-151690 nolu Kampüs Altyapısı projesine ait detaylar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Uşak Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Uşak Üniversitesi
Proje No	2020H03-151690
Karakteristik	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale Hattı, Telefon Hattı
Proje Başlama Yılı	2020

Proje Bitiş Yılı	2022
Proje Tutarı TL	9.200.000,00
Kesintili Başlangıç Ödeneği TL	2.000.000,00
Eklenen TL	2.500.000,00
Düşülen TL	0,00
Toplam Ödenek TL	4.500.000,00
Harcama TL	1.750.377,00
Kalan Ödenek TL	2.749.623,00
Gerçekleşme Oranı (%)	38,90

2022 yılında proje kapsamında aşağıdaki faaliyetler yapılmıştır.

- Bir Eylül yerleşkesi suni gölet makine dairesi kollektör hattının yenilenmesi,
- Bir Eylül yerleşkesi suni gölet makine dairesi pompa yapılması,
- Bir Eylül yerleşkesi peyzaj alanları için mal alımı ve uygulanması,
- Bir Eylül yerleşkesi öğrenci yaşam merkezi binası yanında bulunan altyapı bacaları arası kazı yapıp koruge boru döşenmesi,
- Bir Eylül yerleşkesi öğrenci yaşam merkezi binası yanında bulunan altyapı bacaları arası kazı yapıp koruge boru döşenmesi,
- Atıksu arıtma tesislerindeki çökertme tanklarının temizleme pompalarının değiştirilmesi ve yeni pompa takılması,
- Bir Eylül yerleşkesi atık su hattı tıkalı boruların değiştirilmesi,
- Bir Eylül yerleşkesinde kullanılmak üzere kırma taş alımı,
- Bir Eylül yerleşkesinde kullanılmak üzere hazır beton alımı,
- Bir Eylül yerleşkesinde kullanılmak üzere plastik boru alımı,
- Çelik hasır alımı,
- Muhtelif yerlerde kullanılmak üzere döşeme taşı alımı,
- Muhtelif gölet bakım malzemesi alımı,
- Bir Eylül yerleşkesi şelale tamirat yapımı,
- Bir Eylül yerleşkesi çim alanlarında kullanılmak üzere malzeme alımı.

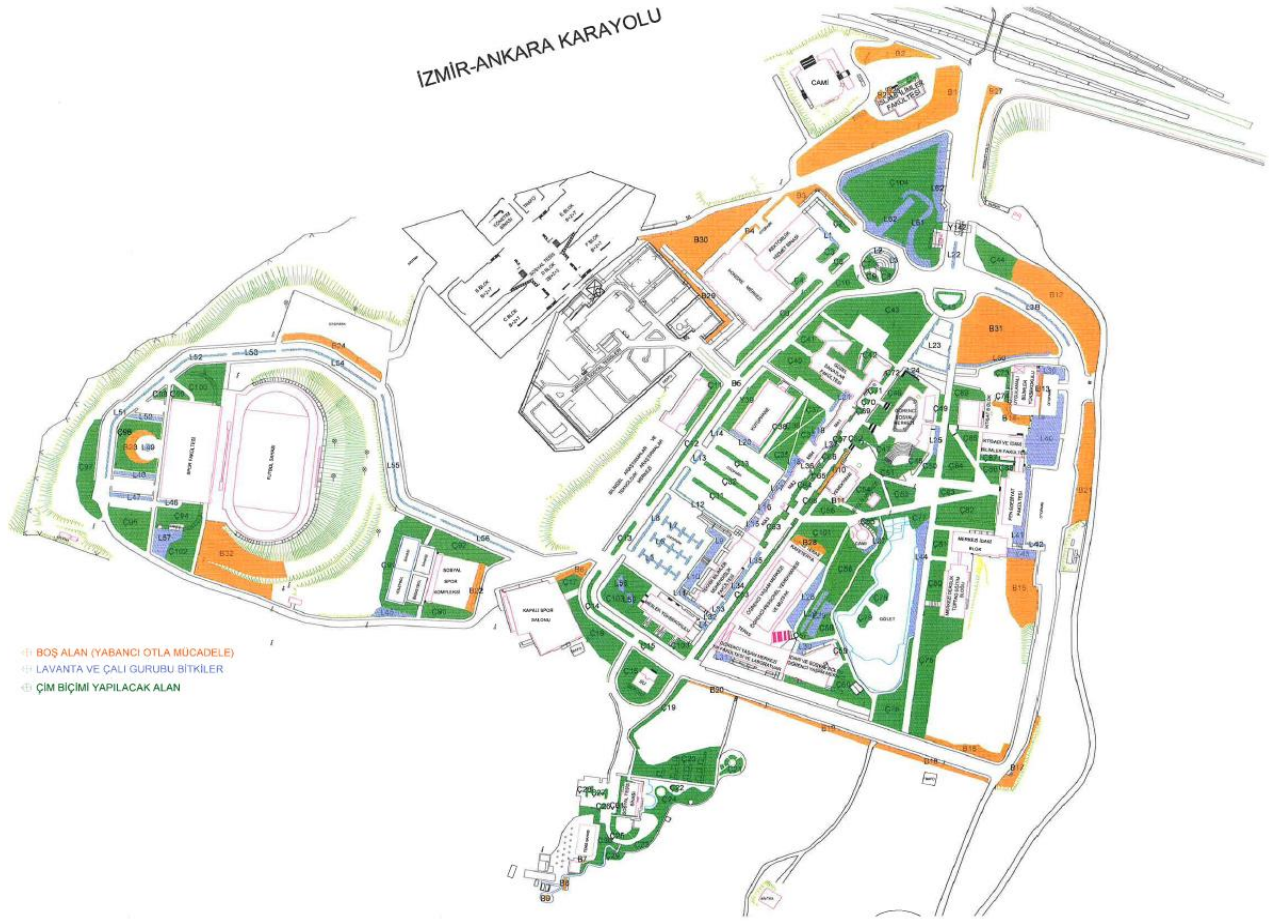

((Uşak Üniversitesi 1 Eylül Yerleşkesi Peyzaj Yapımı ve Bakım Onarımı))



((Uşak Üniversitesi 1 Eylül Yerleşkesi Peyzaj Yapımı ve Bakım Onarımı))



(Uşak Üniversitesi 1 Eylül Yerleşkesi Peyzaj Yapımı ve Bakım Onarımı)

3.1.2 2008H03-945 Derslik ve Merkezi Birimler (Tasarım Merkezi)

Söz konusu proje kapsamında Üniversitemize 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 8.000.000,00 TL ödenek verilmiştir. Projeye ödenek revizyonu yapılmıştır. Projenin 2022 yıl sonu ödeneği 16.060.000,00 TL'dir. Bu ödeneğin 16.059.130,00 TL'si harcanmıştır. Projenin nakdi gerçekleşme oranı %99,99'dur. 2008H03-945 numaralı Tasarım Merkezi projesine ait detaylar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Uşak Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Uşak Üniversitesi
Proje No	2008H03-945-151708
Karakteristik	Eğitim (8.000 m ²)
Alt Projeler	Tasarım Merkezi
Proje Başlama Yılı	2020
Proje Bitiş Yılı	2023
Proje Tutarı TL	42.000.000,00
Kesintili Başlangıç Ödeneği TL	8.000.000,00
Eklenen TL	8.060.000,00

Düşülen TL	0,00
Toplam Ödenek TL	16.060.000,00
Harcama TL	16.059.130,00
Kalan Ödenek TL	870,00
Gerçekleşme Oranı (%)	99,99

Proje kapsamında Tasarım Merkezi Binası yapım işine 31 Mayıs 2021 tarihinde başlanmıştır. 2022 yılında inşası devam etmiştir. Fiziki gerçekleşme oranı %38 olmuştur.

Tasarım Merkezi Binası ihalesine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

İHALE BİLGİLERİ

Adı	Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesi Deri Tekstil Seramik Binası Yapım İşİ
İhale Kayıt No	2021/19697
İhale Sorumlu Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Mevzuat Dayanağı	4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (Madde 19)
Usulü	Açık İhale Usulü
İhale Tarihi	16.03.2021
İş Artış / Azalış Oranı(%)	%0
İşin Türü	Yapım
Yaklaşık Maliyet (TL)	53.295.421,00
Fiziki Gerçekleşme	%38

SÖZLEŞME DETAYLARI

İşin Başlangıç Tarihi	31.05.2021
İşin Bitiş Tarihi	20.06.2023
Bedeli (KDV Hariç, TL)	35.631.000,00
Sözleşme Tarihi	27.05.2021



(Deri Tekstil Seramik Tasarım Merkezi Binası)



(Deri Tekstil Seramik Tasarım Merkezi Binası)



(Deri Tekstil Seramik Tasarım Merkezi Binası)



(Deri Tekstil Seramik Tasarım Merkezi Binası)

3.1.3 2008H03-945 Derslik ve Merkezi Birimler (Eşme Meslek Yüksekokulu)

Söz konusu proje kapsamında Üniversitemize 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile ödenek verilmemiştir. Yıl içi yeni proje olarak yatırım programına eklenmiştir. 2022 yılı ödeneği 5.200.000,00 TL'dir. Bu projeden harcama yapılmamıştır. 2008H03-945-190860 numaralı Eşme Meslek Yüksekokulu projesine ait detaylar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Uşak Üniversitesi
Projeyi Yükleen Kuruluş	Uşak Üniversitesi
Proje No	2008H03-945-190860
Karakteristik	Eğitim (5.000 m ²)
Alt Projeler	Eşme Meslek Yüksekokulu
Proje Başlama Yılı	2022
Proje Bitiş Yılı	2024
Proje Tutarı TL	52.000.000,00
Kesintili Başlangıç Ödeneği TL	0,00
Eklenen TL	5.200.000,00
Düşülen TL	0,00
Toplam Ödenek TL	5.200.000,00
Harcama TL	0,00
Kalan Ödenek TL	5.200.000,00
Gerçekleşme Oranı (%)	0,00

Eşme Meslek Yüksekokulu Binasının (5.000m2) 2023 yılı içerisinde ihalesine çıkılması ve inşaatına başlanması planlanmaktadır.



(Uşak Üniversitesi Eşme Meslek Yüksekokulu Projesi)

3.1.4 2016H05-41320 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

Söz konusu proje kapsamında Üniversitemize 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 3.000.000,00 TL ödenek verilmiştir. Projeye ödenek revizyonu yapılmamıştır. Projenin yıl sonu ödeneği 3.000.000,00 TL'dir. Bu ödeneğin 191.573,00 TL'si harcanmıştır. 2022 yılı nakdi gerçekleşme oranı %6,39'dur. 2016H05-41320 nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri projesine ait detaylar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Sektörü	Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor
Proje Sahibi	Uşak Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Uşak Üniversitesi
Proje No	2016H05-41320
Karakteristik	Spor Tesis (7.500 m ²), Tribün (5.000 seyirci kapasitesi)
Alt Projeler	BESYO Kompleksi
Proje Başlama Yılı	2016
Proje Bitiş Yılı	2022
Proje Tutarı TL	44.500.000,00
Kesintili Başlangıç Ödeneği TL	3.000.000,00
Eklenen TL	0,00
Düşülen TL	0,00
Toplam Ödenek TL	3.000.000,00
Harcama TL	191.573,00
Kalan Ödenek TL	2.808.427,00
Gerçekleşme Oranı (%)	6,39

Proje kapsamında aşağıdaki işler yapılmıştır.

- Spor Fakültesi ana çim sulama hattındaki patlak tamir edilmiştir.
- Kapalı Spor Salonu Yüzme Havuzuna ait olan makine dairesi devir daim hattının arıza bakım onarımı yapılmıştır.





(Spor Bilimleri Fakültesi ve Sentetik Atletizm Pistli Futbol Sahası)

3.1.5 2017K12-40721 İhtisaslaşma Projesi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından koordine edilen ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Birlikte eşgüdüm halinde yürütülen "Üniversitelerimizin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması" temalı program kapsamında Uşak Üniversitesi "Deri, Tekstil ve Seramik" alanlarında pilot üniversite olarak ilan edilmiştir. Bu sürecin başlamasıyla çalışmalar hızla devam etmiştir. Bu program ile Üniversitemizin ülkemiz hedefleri kapsamında, başta Uşak şehri ve bölgemiz ile bütünleşmesinin sağlanması, deri, tekstil ve seramik alanlarında iktisadi, sosyal ve beşeri sermayenin geliştirilmesi adına çalışmalarını derinleştirmesi, ilgili alanlar özelinde tek tipten uzaklaşarak kurumsal farklılık ve çeşitliliğe yönelmesi, güçlü yönlerini bu sektörlerin kalkınmasına odaklaması amaçlanmaktadır. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı "Deri, Tekstil ve Seramik Alanlarında İhtisaslaşma Projesi" ni 2017 Yılı Yatırım Programına dahil etmiştir. 49.459.000,00 TL toplam maliyetli projenin 2022 yılı ödeneği 2.000.000,00 TL'dir. Ödeneğin tamamı DTS özel hesabına aktarılmıştır.

Sektörü	DKH-SOSYAL-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA
Proje Sahibi	Uşak Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Uşak Üniversitesi
Proje No	2017K12-40721
Karakteristik	Bakım Onarım, Basılı Yayın Alımı, BİT, Elektronik Yayın Alımı, Etüt-Proje,Müşavirlik, Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma
Alt Projeler	Deri, Tekstil ve Seramik Sekt. İhtisaslaşma Projesi
Proje Başlama Yılı	2017
Proje Bitiş Yılı	2023
Proje Tutarı TL	49.459.000,00
Kesintili Başlangıç Ödeneği TL	2.000.000,00

Eklenen TL	0,00
Düşülen TL	0,00
Toplam Ödenek TL	2.000.000,00
Harcama TL	2.000.000,00
Kalan Ödenek TL	0,00
Gerçekleşme Oranı (%)	100,00

İhtisaslaşma Projesi kapsamında 2022 yılında yapılan faaliyet ve etkinlikler aşağıda verilmiştir.

Deri Birimi

- İzmir Bornova’da faaliyet gösteren DERİ COMPANY, deri firmasının üretim atölyesi ziyaret edilmiştir. DTS Tasarım Merkezi deri tasarım uzmanlarından Öğr. Gör. Sinem ÜREL, Atölye şefi Nasuh Bey ile görüşme yaparak, deri ustalarının çalışmaları incelenmiştir. Deri Company ile yapılacak olan tasarım, kalıp ve föy çalışmaları hakkında çalışmalar planlanmıştır.
- Merkezimiz Öğr. Gör. Cemile Ceren Tosun 21-25 Şubat 2022 tarihleri arasında Erasmus+ Personel Hareketliliği ile Obuda Üniversitesi Hafif Sanayi ve Çevre Mühendisliği bölümüne ziyarette bulunmuştur. Orada bulunduğu süre içerisinde ‘Deri Sanayisinde Sürdürülebilirlik’ konulu bir eğitim de veren öğretim görevlimiz Budapeşte’de bulunan olası paydaşlarla da temaslarda bulunmuştur.
- Indata Endüstriyel Veri Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. ile işbirliğinde gerçekleştirilen “Deri Ürünleri Tasarımına Yönelik Corel Draw Eğitimi” Merkezimiz Deri Bölümü tasarım uzmanlarından Öğr. Gör. Sinem ÜREL’in katkılarıyla Uşak deri firmalarından “RG DERİ ve CEVAHİR DERİ” çalışanlarına verilmiştir.
- 1981 yılından beri yılda iki kez yapılan, prestijli fuarlar listesinde yer alan ve uluslararası pazarda önemli bağlantılara ev sahipliği yapan “LINEAPELLE MİLANO / INTERNATIONAL EXHIBITION OF LEATHER, ACCESSORIES, COMPONENTS, FABRICS, SYNTHETICS AND MODELS” adlı fuar 20-22 Eylül 2022 tarihlerinde İtalya’da düzenlendi. Yaklaşık 1200 katılımcı ve 20.000 ziyaretçinin konuk olduğu, deri ve deri aksesuarları, kumaş ve sentetiklerin sergilendiği fuarda RG Deri ve CEVAHİR DERİ firmaları katılımcı olarak yer aldı.
- Fuarda, 1-26 Ağustos 2022 tarihlerinde, Deri, Tekstil, Seramik Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi tasarım uzmanlarından Öğr. Gör. Sinem ÜREL tarafından verilen “Deri Ürün Tasarımına Yönelik Corel Draw Eğitimi” kapsamında tasarlanan lazer kesim deriler de RG DERİ ve CEVAHİR DERİ stantlarında sergilendi.
- 11 Kasım 2022 Tarihinde Ankara Kızılay semtinde bulunan ‘MODEL DERİ’ adlı deri firmasına DTS Tasarım, Uygulama ve Araştırma Merkezi Tanıtımı ve firma ziyaretleri kapsamında Bir ziyaret gerçekleştirilmiştir. Deri tasarımı uzmanlarından Öğr. Gör. Sinem

ÜREL, firma yetkilileri ve atölye ustaları ile görüşmeler yaparak, atölyedeki çalışmalarını incelemiştir. Deri tasarımı alanında firmaya tasarım ve kalıp desteği verilmesi konusunda bilgilendirme yapılmıştır. DTS ve MODEL DERİ arasında yapılacak olan işbirlikleri konusunda planlamalar yapılmıştır.

Tekstil Birimi

- Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Birimi ekibi için yazlık ve kışlık üniforma tasarımı ve şartname yazımı projeleri yapılmıştır.
- Sağlık Bakanlığı UMKE birimi ekibi için yazlık ve kışlık üniforma tasarım revizyonu ve şartname yazımı projeleri yapılmıştır.
- Orman Genel Müdürlüğü yazlık ve kışlık üniforma tasarım revizyonu ve şartname yazımı projeleri yapılmıştır.
- PTT Posta Telgraf Teşkilatı Birimi ekibi için yazlık ve kışlık üniforma tasarımı ve şartname yazımı projeleri yapılmıştır.
- Ev tekstil nevresim alanında tasarımlar yapılmış bölge firmalarına sunulmuştur.
- Ağaoğlu Tekstil Firmasının Home Harmony ev tekstili 11 tasarım verilmiştir.
- Ağaoğlu Tekstil Firmasının Home Harmony ev tekstili grubu için DİJİTAL KATALOG projesi yapılmıştır.
- T.C. Sağlık Bakanlığı, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2022 Kışlık Kıyafet Tasarımı ve Şartnamesi Hazırlama Projesi yapılmıştır.
- T.C. Sağlık Bakanlığı, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) 2022 Kıyafet Tasarımı ve Şartname Yazımı Projesi yapılmıştır.
- OGM Orman Genel Müdürlüğü Orman Zararlılarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı 2022 Yılı Kıyafet Tasarımı ve Şartname Yazımı Projesi yapılmıştır.
- İstanbul Hometex 2022 Tekstil Fuarı, Fashion Prime İzmir Fuarı ve Fashiontech İzmir Fuarı ziyaretleri yapılmış farklı firmaya merkez tanıtımı yapılmış ve yeni iş Birlik bağlantıları kurulmuştur.
- Dünyanın önde gelen tekstil fuarlarından biri olan HEIMTEXTİL fuarında, tasarım merkezimiz ile iş birliği halinde olan Menderes Tekstil'in yeni koleksiyon ve trend tanıtımlarında merkezimizde yapılan desen tasarımları yer almaktadır. Yeni koleksiyonlarını tanıttıkları ana yatak üzerinde, merkezimiz tasarım uzmanlarından Öğr. Gör. Neslihan Öpöz'ün tasarımı yer almaktadır.
- Dünyanın önde gelen tekstil fuarlarından biri olan HEIMTEXTİL fuarında, tasarım merkezimiz ile iş birliği halinde olan Ağaoğlu Tekstil tasarımlarını sergilemiştir. Ağaoğlu'nun 2023 koleksiyonunda merkezimizde yapılan tasarımlar yer almaktadır. Ayrıca firmanın 2023 katalog kapağında merkezimiz tasarım uzmanlarından Öğr. Gör. Neslihan

Öpöz'e ait tasarım yer almaktadır. Ağaoğlu Tekstil'in 2023 tanıtım kataloğu da 3D artırılmış gerçeklik teknolojisi ile merkezimizde tasarlanmıştır. Katalog İç Mekân Tasarımları, merkezimiz tasarım uzmanlarından Öğr. Gör. Fatih Aytekin tarafından gerçekleştirmiştir.

Seramik Birimi

- 10-13 Mart 2022 tarihleri arasında HOST İstanbul 16. Uluslararası Türkiye Ev ve Mutfak Eşyası Üreticileri Fuarında H. Ülger Seramik firması tarafından DTS Tasarım Merkezi Seramik Bölümü tasarımları "*Design by Usak University*" logosu ile sergilenmiştir.
- 5-8 Nisan 2022 tarihleri arasında Las Vegas'ta düzenlenen Coverings 2022 fuarında Termal Seramik firması tarafından Uşak Üniversitesi DTS Tasarım Merkezi Seramik birimi tasarımları "*Design by Usak University*" logosu ile sergilenmiştir.
- 14-17 Eylül 2023 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece – İstanbul'da gerçekleştirilen Zuchex 33. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarında H. Ülger Seramik tarafından Uşak Üniversitesi DTS Tasarım Merkezi tasarımları "*Design by Usak University*" logosu ile sergilenmiştir.
- 26-30 Eylül 2022 tarihleri arasında İtalya'nın Bologna şehrinde düzenlenen CERSAIE Uluslararası Seramik Fuarı'nda Termal Seramik tarafından DTS Tasarım Merkezi Seramik Bölümü tasarımları "*Design by Usak University*" logosu ile sergilenmiştir.
- 7-11 Kasım 2022'de İstanbul Fuar Merkezi'nde Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı, UNICERA'da Uşak Seramik firması tarafından Uşak Üniversitesi Deri, Tekstil ve Seramik (DTS) Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Seramik Birimi tasarımları "*Design by Usak University*" logoları ile sergilenmiştir.
- DTS Tasarım Merkezi Seramik Birimi personelleri Öğr. Gör. Gülçin Çavdar ve Öğr. Gör. Ceyda Sıki'nin hazırlamış oldukları tasarımlar ile Türkiye Patent Enstitüsüne başvuruları sonucunda 4 tasarım onaylanarak tasarım tescil belgesi almaya hak kazandı. Üniversitemiz adına bu alanda bir ilk olan bu belge ile hazırlanan tasarımlar, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında 28/12/2021 tarihinden itibaren 5 yıl süreyle korunmak üzere tescil edilmiştir.
- 27 Nisan 2022 tarihinde Uşak Üniversitesi'nin "Us-tech Nitelikli İstihdam Merkezi" ZAFER-2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Teknoloji Transfer Ofisi tarafından düzenlenerek Google Meeting platformu üzerinden DTS Tasarım Merkezinde görevli Öğr. Gör. Ceyda SIKI tarafından "*Seramik Üretimi, Uygulamaları ve Yüzey Tasarımı*" adlı çevrimiçi eğitim gerçekleştirilmiştir.
- 18 Mayıs 2022 tarihinde Kale Seramik Sağlık Gereçleri Tasarım ve Ürün Geliştirme Müdürü Tolga Berkay'ın katılımcı olduğu Moderatörlüğünü Öğr. Gör. Ceyda SIKI'nın yaptığı "*Vitrifiye Ürünlerinde Tasarım Süreçleri*" söyleşisi gerçekleştirilmiştir.

- Uşak Üniversitesi DTS Tasarım Merkezi Seramik Biriminde Görev alan Öğr. Gör. Ceyda SIKI, Erasmus + Akademik Personel Hareketliliği kapsamında İtalya Faenza'da bulunan ISIA FAENZA Yüksek Sanat Endüstrileri Enstitüsü'ne ziyarette bulunmuştur. Uşak Üniversitesi ve DTS Tasarım Merkezi tanıtılmıştır. Olası işbirlikleri ve ortak projeler hakkında görüşmeler yapılmıştır.
- 6-10 Haziran 2022 tarihleri arasında 16 farklı ülkeden 34 üniversitenin katılımıyla “Re-connection in New Era” temalı 3. Uluslararası Hafta (International Staff Week) etkinliği kapsamında “*Türk El Sanatları Baskı*” atölyesinde görev alınmıştır.
- 19-21 Eylül 2022 tarihleri arasında Uşak Üniversitesi 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 19-21 Eylül 2022 Oryantasyon Programı kapsamında DTS Tasarım Merkezi Müdürü Doç. Dr. Eren Öner, Öğr. Gör. Cemile Ceren Tosun, Öğr. Gör. Fatih Aytekin, Öğr. Gör. Ceyda SIKI 22 Eylül 2022 tarihinde “*DTS ile Tasarım Dünyasına Giriş*” adlı sunumunu gerçekleştirmiştir.
- 26 Eylül – 29 Eylül 2022 tarihleri arasında İtalya’nın Bolonya şehrinde düzenlenen ve dünya çapında 600’ün üzerinde seramik üreticisinin katılım gösterdiği CERSAIE Seramik ve Banyo Fuarına DTS Tasarım Merkezi Seramik Birimi Öğretim Görevlileri katılım sağlamıştır.
- 19-23 Eylül 2022 tarihleri arasında DTS Tasarım Merkezi Öğr. Gör. Gülçin Çavdar tarafından KARO METRO Seramik firma çalışanlarına “*Dijital Görüntü Tasarımı ve Görüntü Renk Yönetimi Eğitimi*” Beş gün süre boyunca tasarımcısına uygulamalı olarak eğitim verilmiştir.
- 31 Ekim 2022 tarihinde DTS Tasarım Merkezi Öğr. Gör. Gülçin Çavdar tarafından firma için porselen tabak sektörüne Bir gün süre ile dijital baskı sistemi eğitimi verilmiştir.

3.1.6 2021I00-166922 Dış Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Söz konusu proje kapsamında Üniversitemize 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 10.600.000,00 TL ödenek verilmiştir. Projeye 17.000.000,00 TL ödenek revizyonu yapılmıştır. Projenin yıl sonu ödeneği 27.600.000,00 TL’dir. Bu ödeneğin 6.693.759,00 TL’si harcanmıştır. Projenin fiziki gerçekleşme oranı %8, nakdi gerçekleşme oranı %24,25’tir. 2021I00-166922 nolu Dış Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi projesine ait detaylar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Sektörü	SAĞLIK
Proje Sahibi	Uşak Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Uşak Üniversitesi
Proje No	2021I00-166922
Karakteristik	Hastane İnşaatı (15.000 m ²)
Proje Başlama Yılı	2021
Proje Bitiş Yılı	2025
Proje Tutarı TL	195.000.000,00
Kesintili Başlangıç Ödeneği TL	10.600.000,00

Eklenen TL	17.000.000,00
Düşülen TL	0,00
Toplam Ödenek TL	27.600.000,00
Harcama TL	6.693.759,00
Kalan Ödenek TL	20.906.241,00
Gerçekleşme Oranı (%)	24,25

2021 mali yılında Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yapım İşi ihalesine çıkılmış ve inşaatına başlanılmıştır. 2021 mali yılı içerisinde 989.798,97 TL harcama yapılmıştır. 2022 mali yılı içerisinde ise 6.693.758,94 TL harcama yapılmıştır. Müteahhittin 03.06.2022 Tarihli fesih ve tasfiye işlemleri dilekçesine istinaden; kaba inşaat olarak bodrum ve zemin kat aşamasında 13.05.2022 tarih 31834 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 5546 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca tasfiye edilmiştir. Proje 15.000 m2 olacak şekilde revize edilmiş olup toplam proje bedeli 195.000.000,00 TL'dir. Proje tadilat çalışmaları tamamlanmış tekrar yapım ihalesine çıkılmıştır fakat katılımcı olmadığı için ihale iptal edilmiştir.



(Diş Hekimliği Fakültesi ve Diş Hastanesi Binası)



(Diş Hekimliği Fakültesi ve Diş Hastanesi Binası)

3.2 TAMAMLANAN PROJELER

2022 Yılı Yatırım Programı ile Üniversitemize verilen yatırım projelerinden 5 tanesi 2022 yılı içinde tamamlanmıştır. Tamamlanan projelerimiz aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

PROJE NO	SEKTÖR	PROJE ADI	PROJE SAHİBİ
2022H03-187108	Eğitim	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Uşak Üniversitesi
2022H03-187116	Eğitim	Muhtelif İşler	Uşak Üniversitesi
2022H03-187114	Eğitim	Yayın Alımı	Uşak Üniversitesi
2022I00-180009	Sağlık	Muhtelif İşler	Uşak Üniversitesi
2022K12-186801	Tek. Arş.	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	Uşak Üniversitesi

3.2.1 2021H03-168023 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi

Söz konusu proje kapsamında Üniversitemize 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 200.000,00 TL ödenek verilmiştir. Projeye yapılan aktarma ve ekleme işlemlerinden sonra projenin yıl sonu ödeneği 2.140.000,00 TL olmuştur. Bu ödeneğin 1.331.735,00 TL'si harcanmış olup nakdi gerçekleşme oranı %62,23'dür. 2022H03-187108 numaralı Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesine ait detaylar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Uşak Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Uşak Üniversitesi
Proje No	2022H03-187108
Karakteristik	Etüt-Proje
Proje Başlama Yılı	2022
Proje Bitiş Yılı	2022
Proje Tutarı TL	2.140.000,00
Kesintili Başlangıç Ödeneği TL	200.000,00
Eklenen TL	1.940.000,00
Düşülen TL	0,00
Toplam Ödenek TL	2.140.000,00
Harcama TL	1.331.735,00
Kalan Ödenek TL	808.265,00
Gerçekleşme Oranı (%)	62,23

Proje kapsamında aşağıdaki işlemler yapılmıştır.

- Bir Eylül yerleşkesi heyelan önleme ve erozyon önleme projesi ve zemin etüdü yaptırılması proje alım işi fiyat farkı ödemesi

- Dış hekimliği uygulama ve araştırma hastanesi proje revizyonu hizmet alımı

Proje kapsamında yapılan ihale bilgileri aşağıda verilmiştir.

İHALE BİLGİLERİ

Adı	Uşak Üniversitesi Dış Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi Proje Revizyonu Hizmet Alım İşİ
İhale Kayıt No	22DT887756
İhaleden Sorumlu Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Mevzuat Dayanağı	4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
Usulü	22-b
İhale Tarihi	
İş Artış / Azalış Oranı(%)	
İşin Türü	Hizmet
Yaklaşık Maliyet (TL)	₺1.050.000,00

SÖZLEŞME DETAYLARI

İşin Başlangıç Tarihi	
İşin Bitiş Tarihi	19.10.2022
Bedeli (KDV Hariç, TL)	₺1.050.000,00
Sözleşme Tarihi	26.09.2022



(Uşak Üniversitesi Dış Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi Projesi)

3.2.2 2022H03-187116 Muhtelif İşler

Söz konusu proje kapsamında Üniversitemize 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2.500.000,00 TL ödenek verilmiştir. Projeye yapılan aktarma ve ekleme işlemleri sonucunda projenin yıl sonu ödeneği 16.624.100,00 TL olmuştur. Bu ödeneğin 13.668.020,00 TL'lik kısmı harcanmış olup, nakdi gerçekleşme oranı %82,22'dir. 2022H03-187116 nolu Muhtelif İşler projesine ait detaylar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Uşak Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Uşak Üniversitesi
Proje No	2022H03-187116
Karakteristik	Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap,Makine-Teçhizat
Proje Başlama Yılı	2022
Proje Bitiş Yılı	2022
Proje Tutarı TL*	16.624.100,00
Kesintili Başlangıç Ödeneği TL	2.500.000,00
Eklenen TL	14.124.100,00
Düşülen TL	0,00
Toplam Ödenek TL	16.624.100,00
Harcama TL	13.668.020,00
Kalan Ödenek TL	2.956.080,00
Gerçekleşme Oranı (%)	82,22

Proje kapsamında yapılan ihale bilgileri aşağıda verilmiştir.

İHALE BİLGİLERİ

Adı	Uşak Üniversitesi Bir Eylül Yerleşkesinde Bulunan İslami İlimler Fakültesi, Kütüphane Binası, İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi A Blok ve MA2 Binaları Çatı Teras Uygulamaları İşİ
İhale Kayıt No	2022/1007223
İhaleden Sorumlu Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Mevzuat Dayanağı	4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
Usulü	Açık
İhale Tarihi	
İş Artış / Azalış Oranı(%)	%9,79
İşin Türü	Yapım
Yaklaşık Maliyet (TL)	₺2.651.201,98

SÖZLEŞME DETAYLARI

İşin Başlangıç Tarihi	22.11.2022
İşin Bitiş Tarihi	06.01.2023
Bedeli (KDV Hariç, TL)	₺2.218.000,00
Sözleşme Tarihi	22.11.2022

İHALE BİLGİLERİ - 2

Adı	2022/924120 İhale Kayıt Numaralı Uşak Üniversitesi 1 Eylül Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi Laboratuvarı Zemin Tadilatı ve Alüminyum Bölmelerinin Üzerlerinin Kapatılması Yapım İşİ
İhale Kayıt No	2022/924120
İhaleden Sorumlu Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Mevzuat Dayanağı	4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
Usulü	Açık
İhale Tarihi	
İş Artış / Azalış Oranı(%)	%5,83
İşin Türü	Yapım
Yaklaşık Maliyet (TL)	₺167.584,00

SÖZLEŞME DETAYLARI

İşin Başlangıç Tarihi	20.10.2022
İşin Bitiş Tarihi	18.11.2022
Bedeli (KDV Hariç, TL)	₺199.450,00
Sözleşme Tarihi	19.10.2022

Bu projeden sorumlu birimlerimiz aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

BİRİM	KBÖ	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	800.000,00	1.294.000,00	868.468,78
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	900.000,00	7.120.000,00	4.912.488,51
Yapı işleri ve teknik Daire Başkanlığı	800.000,00	8.124.100,00	7.806.660,41
Tıp Fakültesi	0,00	36.000,00	31.413,50
	0,00	50.000,00	48.989,28
TOPLAM	2.500.000,00	16.624.100,00	13.668.020,48

Proje kapsamında;

- Kütüphane, güzel sanatlar fakültesi, sivaslı meslek yüksekokulu, kapalı spor salonu ve spor kompleksi binalarındaki sirkülasyon, hidrofor, pis su pompaları arızalarının bakımı ve onarımı
- Bir Eylül yerleşkesi binalarında muhtelif poliüretan enjeksiyon uygulanması
- Bir Eylül yerleşkesi nizamiye önü korkuluk yapılması ve fen edebiyat fakültesi basamak kaplaması yapılması
- Rektörlük Hizmet Binası ve Kongre Merkezi merdiven boşluklarına güvenlik ağı yapılması
- Bir Eylül Yerleşkesi Rektörlük ve Kongre Binası kazan dairesindeki doğalgaz çelik kazanlarının tamiratının yapılması
- Bir Eylül Yerleşkesinde bulunan 33 adet insan asansörü, 1 adet engelli asansörü ve 2 adet yük asansörü olmak üzere toplam 36 adet asansörün teknik şartnamede belirtildiği üzere 3 aylık periyodik bakım onarımının yapılması
- Volanlı arşiv dolabı alımı
- Bilgisayar ve monitör alımı
- Toplantı masası alımı
- 10 adet osiloskop alımı
- Kapalı spor salonu spor aletleri bakım onarımı yapılması
- 4 kalem dokuma tezgahı alımı
- Bisiklet malzemesi alımı
- Perde alımı
- Bir Eylül Yerleşkesinde bulunan İslami İlimler Fakültesi, Kütüphane Binası, İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi a blok ve ma2 binaları çatı teras uygulamaları
- Bir Eylül yerleşkesi Tıp Fakültesi 2 adet bilgisayar laboratuvarı elektrik tesisatı yapımı
- Eşme Meslek Yüksekokulu genel bakım onarımının yaptırılması
- Kompanzasyon panolarında kullanılmak üzere malzeme alımı
- Elektrik malzemesi alımı
- İp telefon alımı
- Bir Eylül Yerleşkesi merkezi jeneratör senkron sisteminin arızasının giderilmesi
- Bir Eylül Yerleşkesi açık spor tesisleri zemin kaplamaları yapımı
- Bir Eylül Yerleşkesi halı saha branda değiştirilmesi
- Bir Eylül Yerleşkesi kaldırım tadilatı yapılması
- Uşak Üniversitesi bünyesinde kullanılmak üzere inşaat malzemesi alımı
- Uşak Üniversitesi bünyesinde kullanılmak üzere hırdavat malzemesi alımı
- Bir Eylül Yerleşkesi enerji merkezinde bulunan ups cihazına ve otomasyon panosuna akü alımı
- Bir Eylül Yerleşkesi bisiklet yollarında kullanılmak üzere boya alımı
- Bir Eylül Yerleşkesi bisiklet yolları ve otoparklarda kullanılmak üzere şablon ve boya alımı
- Banaz Meslek Yüksekokulu, Sivaslı Meslek Yüksekokulu, Karahallı Meslek Yüksekokulu, Ulubey Meslek Yüksekokullarında kullanılmak üzere boya malzemesi alımı
- Elektrikli boya makinesi alımı
- Güzel Sanatlar Fakültesinin boyanması
- Bir Eylül Yerleşkesinde kullanılmak üzere klor malzemesi alımı
- Bir Eylül Yerleşkesi genelinde çeşitli inşaat işleri yapımı
- Demir sac malzemeleri, alüminyum kapı ve parçaları malzeme alımı
- Bir Eylül Yerleşkesi İktisat Fakültesi merdiven boşluğuna alçı, sıva ve boya yapılması; MA1 blok 1. kat psikoloji laboratuvarının alçıpan duvar ile bölünmesi yapımı
- İzolasyon malzemesi alımı
- Bir Eylül Yerleşkesinde bulunan çeşitli metal boruların ve korkulukların tamiri ve boyanması ile demir merdiven yapılması
- Kütüphane binasında kırılan camların değiştirilmesi

- Uygulamalı Bilimler Fakültesi çatı tamiratı onarımının yapılması
- Yemekhane binasına alüminyum doğramadan oda yapılması
- Bir Eylül Yerleşkesinde kullanılmak üzere seramik yapıştırıcı ve derz dolgu alımı
- Çelik hasır alımı
- Seramik alımı
- Baca gazı analiz raporlarının alınması
- Eşme Meslek Yüksekokulu kalorifer sistemi eksiklerinin tamamlanması
- Bir Eylül Yerleşkesi çeşitli pompa tamir işleri yapılması
- Spor kompleksi kaskad kombilerinin fan motoru ve sirkülasyon pompası arızasının yapılması
- 4 cm kalınlığında andezit levha ile döşeme kaplaması (30cmxserbest boy) yapımı
- Elenmiş kum alımı
- Led panel alımı
- Projektör alımı
- Betopan alımı
- Gazbeton alımı
- Bir Eylül Yerleşkesi Öğrenci Yaşam Merkezi asma tavan yapımı
- Öğrenci Yaşam Merkezi ve gölet güney sahası kanalizasyon hatları hasarlarının tadile edilmesi
- Bir Eylül Yerleşkesi muhtelif alanlara şev taşı uygulamasının yapılması
- İslami İlimler Fakültesi çatısında vrf dış üniteleri kaide üzerine konulması
- Bir Eylül Yerleşkesi nizamiye girişine bariyer yapılması
- Karahallı Meslek Yüksekokulunda kullanılmak üzere malzeme alımı
- Ulubey Meslek Yüksekokulu öğrenci tuvaletlerinin ve lavabolarının yapılması
- Bir Eylül Yerleşkesi çim alanlarında kullanılmak üzere malzeme alımı
- Mühendislik Fakültesi laboratuvarı zemin tadilatı ve alüminyum bölmelerinin üzerlerinin kapatılması yapılmıştır.



(Bilgisayar)



(Monitör)



(Dokuma Makinesi)



(Osiloskop)



(Spor Aletleri Bakım Onarımı)



(Volanlı Arşiv Dolabı)



(Goldsit Edina Edina Masa 160 Lık Etejer Kesonlu "L" Tipi 2'li Masa Takımı)



(4line kapitone 4li0229 misafir koltuğu)



(4line kapitone 4li0228 çalışma koltuğu)



(İslami İlimler Fak, Fen Edebiyat Fak, Eğitim Fak, MYO ve Kütüphane Binası Erişebilirlik Yatay ve Dikey Engelli Asansörleri)



(İslami İlimler Fak, Fen Edebiyat Fak, Eğitim Fak, MYO ve Kütüphane Binası Erişilebilirlik Yatay ve Dikey Engelli Asansörleri)

3.2.3 2022H03-168025 Yayın Alımı

Söz konusu proje kapsamında Üniversitemize 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 1.000.000,00 TL ödenek verilmiştir. Projeye yapılan aktarma ve ekleme işlemlerinden sonra projenin yıl sonu ödeneği 1.750.000,00 TL olmuştur. Bu ödeneğin 1.739.557,00 TL'si harcanmış olup nakdi gerçekleşme oranı %99,40'dır. 2022H03-187114 numaralı Yayın Alımı projesine ait detaylar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Sahibi	Uşak Üniversitesi
Projeyi Yüklelen Kuruluş	Uşak Üniversitesi
Proje No	2022H03-187114
Karakteristik	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı
Proje Başlama Yılı	2022
Proje Bitiş Yılı	2022
Proje Tutarı TL	1.750.000,00
Kesintili Başlangıç Ödeneği TL	1.000.000,00
Eklenen TL	750.000,00
Düşülen TL	0,00
Toplam Ödenek TL	1.750.000,00
Harcama TL	1.739.557,00
Kalan Ödenek TL	10.443,00
Gerçekleşme Oranı (%)	99,40

2022 yılında Yayın Alımıprojesi kapsamında yapılan harcamalar aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.

S.N.	İHALE ADI	Mevzuat Dayanağı	Usulü	İhale Bedeli	Ödeme Tarihi
1	Mathscinet Veritabanı	4734 sayılı KİK 22/b madde	Doğrudan Temin	62.384,58	09.03.2022
2	Uptodate Veri Tabanı	4734 sayılı KİK 22/b madde	Doğrudan Temin	178.013,72	23.05.2022
3	Proquest Central E Books Veri Tabanı	4734 sayılı KİK 22/b madde	Doğrudan Temin	158.557,48	21.07.2022
4	Clinicalkey Veritabanı	4734 sayılı KİK 22/b madde	Doğrudan Temin	347.494,53	20.09.2022
5	Scifinder Veri Tabanı	4734 sayılı KİK 22/b madde	Doğrudan Temin	185.023,87	20.09.2022
6	İncites Veri Tabanı	4734 sayılı KİK 22/b madde	Doğrudan Temin	273.703,95	20.09.2022
7	Vetis Kampüs Dışı Erişim Ve İstatistik Veri Tabanı	4734 sayılı KİK 22/b madde	Doğrudan Temin	47.200,00	17.11.2022
8	Video Lms Vts Veritabanı	4734 sayılı KİK 22/b madde	Doğrudan Temin	23.850,75	06.12.2022
9	Türkiye Atıf Dizini Veri Tabanı	4734 sayılı KİK 22/b madde	Doğrudan Temin	63.720,00	14.12.2022
10	Sobiad Veri Tabanı	4734 sayılı KİK 22/b madde	Doğrudan Temin	10.841,00	14.12.2022
11	Piri Keşif Aracı Veritabanı	4734 sayılı KİK 22/b madde	Doğrudan Temin	21.120,00	16.12.2022
12	Acs Dergiler, Arşiv Ve Ekitaplar Veri Tabanı	4734 sayılı KİK 22/b madde	Doğrudan Temin	290.528,54	20.12.2022
13	Bookcites Veritabanı	4734 sayılı KİK 22/b madde	Doğrudan Temin	14.784,00	14.12.2022
14	İdeal Online E-Dergi Veri Tabanı	4734 sayılı KİK 22/b madde	Doğrudan Temin	62.334,89	17.11.2022
	İdeal Online E-Tıp Kitapları Veri Tabanı	4734 sayılı KİK 22/b madde	Doğrudan Temin		
	İdeal Online Din Bilimleri Kitapları Veri Tabanı	4734 sayılı KİK 22/b madde	Doğrudan Temin		

3.2.4 2022I00-18009 Sağlık-Muhtelif İşler Projesi

Söz konusu proje kapsamında Üniversitemize 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 3.200.000,00 TL ödenek verilmiştir. Projeye revize işlemi yapılmamıştır. Ödeneğin 3.193.625,00 TL'si harcanmış olup nakdi gerçekleşme oranı %99,80'dir. 2022I00-18009 nolu Sağlık-Muhtelif İşler projesine ait detaylar tabloda yer almaktadır.

Sektörü	Sağlık
Proje Sahibi	Uşak Üniversitesi
Projeyi Yüklenen Kuruluş	Uşak Üniversitesi

Proje No	2022I00-180009
Karakteristik	Makine-Teçhizat
Proje Başlama Yılı	2022
Proje Bitiş Yılı	2022
Proje Tutarı TL	3.200.000,00
Kesintili Başlangıç Ödeneği TL	3.200.000,00
Eklenen TL	0,00
Düşülen TL	0,00
Toplam Ödenek TL	3.200.000,00
Harcama TL	3.193.625,00
Kalan Ödenek TL	6.375,00
Gerçekleşme Oranı (%)	99,80

2022 yılında 500 lisans öğrencisi ve 48 uzmanlık eğitimi öğrencisi ile eğitim hayatına sürdüren Dış Hekimliği Fakültemiz, aynı zamanda tüm kamuya açık günlük ortalama 450 hastaya klinik hizmetleri vermektedir. Toplam beş sınıfta 500 öğrencimize lisans eğitimi, 8 ayrı ana dalda 48 öğrencimize de uzmanlık eğitimi verilmekte olup, bu eğitimler teorik ve pratik olarak yapılmaktadır. Özellikle pratik dersler laboratuvar ve kliniklerde tıbbi elektronik cihazlar ile farklı boyut ve özelliklerde aletlerle gerçekleştirilmektedir. Öncelikle lisans öğrencilerinin son sınıfları (4 ve 5.sınıflar) ile uzmanlık eğitimi öğrencilerinin eğitimlerine devam edebilmeleri için kullanılacak cihaz ve aletlerdeki eksiklikler giderilmeye çalışılmıştır.

Proje kapsamında yapılan ihale bilgileri aşağıda verilmiştir.

İHALE BİLGİLERİ

Adı	Monitör Alımı
İhale Kayıt No	10
İhaleden Sorumlu Birim	Dış Hekimliği Fakültesi
Mevzuat Dayanağı	4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
Usulü	Açık
İhale Tarihi	
İş Artış / Azalış Oranı(%)	0
İşin Türü	Mal
Yaklaşık Maliyet (TL)	₺127.154,00

SÖZLEŞME DETAYLARI

İşin Başlangıç Tarihi	15.08.2022
İşin Bitiş Tarihi	16.08.2022
Bedeli (KDV Hariç, TL)	₺107.757,00
Sözleşme Tarihi	16.08.2022

İHALE BİLGİLERİ - 2

Adı	Masaüstü Bilgisayar Alımı
İhale Kayıt No	11
İhaleden Sorumlu Birim	Diş Hekimliği Fakültesi
Mevzuat Dayanağı	4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
Usulü	Açık
İhale Tarihi	
İş Artış / Azalış Oranı(%)	0
İşin Türü	Mal
Yaklaşık Maliyet (TL)	₺520.760,00

SÖZLEŞME DETAYLARI

İşin Başlangıç Tarihi	15.08.2022
İşin Bitiş Tarihi	16.08.2022
Bedeli (KDV Hariç, TL)	₺441.321,00
Sözleşme Tarihi	15.08.2022

İHALE BİLGİLERİ - 3

Adı	Dental Ünit Alımı
İhale Kayıt No	12
İhaleden Sorumlu Birim	Diş Hekimliği Fakültesi
Mevzuat Dayanağı	4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
Usulü	Açık
İhale Tarihi	
İş Artış / Azalış Oranı(%)	0
İşin Türü	Mal
Yaklaşık Maliyet (TL)	₺608.628,00

SÖZLEŞME DETAYLARI

İşin Başlangıç Tarihi	15.08.2022
İşin Bitiş Tarihi	25.10.2022
Bedeli (KDV Hariç, TL)	₺563.544,00
Sözleşme Tarihi	15.08.2022

İHALE BİLGİLERİ - 4

Adı	Mavi Kod Ekipman Alımı
İhale Kayıt No	25
İhaleden Sorumlu Birim	Diş Hekimliği Fakültesi
Mevzuat Dayanağı	4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
Usulü	Açık
İhale Tarihi	
İş Artış / Azalış Oranı(%)	0
İşin Türü	Mal
Yaklaşık Maliyet (TL)	₺42.196,00

SÖZLEŞME DETAYLARI

İşin Başlangıç Tarihi	21.06.2022
İşin Bitiş Tarihi	01.08.2022
Bedeli (KDV Hariç, TL)	₺35.758,00
Sözleşme Tarihi	21.06.2022

İHALE BİLGİLERİ - 5

Adı	Diş Hekimliği e-klinik Malzeme İhalesi
İhale Kayıt No	2022/394333
İhaleden Sorumlu Birim	Diş Hekimliği Fakültesi
Mevzuat Dayanağı	4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
Usulü	Açık
İhale Tarihi	
İş Artış / Azalış Oranı(%)	0
İşin Türü	Mal
Yaklaşık Maliyet (TL)	₺877.612,00

SÖZLEŞME DETAYLARI

İşin Başlangıç Tarihi	19.04.2022
İşin Bitiş Tarihi	27.06.2022
Bedeli (KDV Hariç, TL)	₺460.099,00
Sözleşme Tarihi	16.06.2022


Proje kapsamında;

- Ortodontik malzeme seti alımı
- Fotoğraf makinesi seti alımı
- Cerrahi ortognatik set alımı
- Fantom laboratuvarı bilişim malzeme seti alımı
- Monitör alımı
- Masaüstü bilgisayar alımı
- Dental ünit alımı
- Mavi kod ekipmanı alımı
- Diş hekimliği e-klinik (uzmanlık lisans öğrencileri) için malzeme ihalesi
- Diş hekimliği e-klinik malzeme ihalesi
- E-klinik kartuş ve motor alımı
- E-klinik malzeme alımı
- E-klinik pedodonti kron alımı
- E-klinik yapıştırma simanı alımı
- Endodonti e-klinik malzeme alımı
- Genel e-klinik öğrencileri için kompozit alımı
- Ortodonti e-klinik malzeme alımı
- Yeni eğitim yılı için e-klinik malzeme alımı
- Barkod yazıcı, fotoğraf makinesi lensi ve kırma cihazı alımı yapılmıştır.

Bu proje kapsamında alınan malzemelerden bazılarının fotoğrafları aşağıdadır.




PİYESEMEN



GEÇİCİ YAPIŞTIRMA SİMANI
OJENOLSÜZ



ORTODONTİK PLAK




PİYESEMEN SETİ



ENDODONTİK KLİNİK SETİ




RESTORATİF TEDAVİ SETİ



PHILIPS MONİTÖR



ÇOCUK KRON



ASUS MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR



MUM SPATÜLÜ




ROSON DİŞ ÜNİTİ



ACİL KOD SANTRAL SUNUCU



PAGER ÇAĞRI CİHAZI



BONDİNG AJANI



GUTTA CUT UCU CİHAZI



KABLOSUZ AKTARICI ERİŞİM NOKTASI



ENDODONTİK MOTOR




RESTORATİF KOMPOZİT



ORTODONTİK SET



FOTOĞRAF MAKİNASI SETİ



FOTOĞRAF MAKİNASI LENSİ




APEKS BULUCU



BARKOD YAZICI



TARAYICI



ORTODONTİK TEL

BONDİNG AJANI AKIŞKAN KOMPOZİT



AĞIZDA KULLANILAN SERT BESLEME





PENS SETİ

AERATOR MİKROMOTOR VE
ANGULDURUVA SETİ



A TİPİ SLİKON SETİ



EDTA JEL



KOMPOZİT SETİ



FREZ SETİ



AĞIZ SPATÜLÜ SİMAN FULVARI



PORSELEN LASTİĞİ



PATTERN RESİN

CERRAHİ EL ALETLERİ



CERRAHİ EL ALETLERİ



BİLİŞİM MALZEME SETİ



KAĞIT KIRPMA MAKİNASI



KUMLAMA CİHAZI KABİNİ



TOPIKAL SODYUM FLÖRÜR



ESTETİK KOMPOZİT BONT QUİK
POLİSAJ KİTİ MATRİKS SETİ



EL ALETLERİ



ORTOGNOTİK CERRAHİ SET



VİTOLOMETRE



AKIŞKAN MTA BONDİNGİ
AKIŞKAN KOMPOZİT



KARTUŞ



CAM İYONOMER DOLGU
MADDESİ



PROTEZ LÖÇÜ SETİ



SPERLİK



TAKIM DİŞ



MİNİ İSTENCE



EDTA TOZ



AĞIZ İÇİ KUMLAMA CİHAZI



STERİL CERRAHİ SET



SELF ADEZİV REZİN SİMAN



MODELAJ SPATÜLÜ



FERRUK SÜLFAT



RMO CUTTER



RMO DİSTAL CUTTER



ŞIRINGA BRAKET YAPIŞTIRMA



CERRAHİ PAYASEMEN



CAM İYONOMER BANT
YAPIŞTIRMA



KOMPOMER



HİDROFLORİK ASİT



FLEKSİBLE ALİGNER MATERYALİ



TEDAVİ E KLİNİK MALZEME
SETİ-1



SEYYAR IŞIN TABANCASI



TEDAVİ MALZEME SETİ-3



E KLİNİK MALZEME SETİ-2



DAVYE TAKIMI



PERİODONTAL SET



ORTODONTİK E KLİNİK
MALZEME SETİ



TOZ MTA



E KLİNİK MALZEME SETİ



ENDODONTİ E KLİNİK MALZEME
SETİ



PERİODONTAL SET

		
AİR-FLOW	ESTETİK RESTORASYON SETİ	FOTOPLAK
		
REZİN İÇERİKLİ ADEZİV SİMAN		

3.2.5 2022K12-186801 Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri

Söz konusu proje kapsamında Üniversitemize 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 70.000,00 TL ödenek verilmiştir. Projeye revise işlemi yapılmamıştır. Ödenğin tamamı Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usullerin 5. Maddesine istinaden BAP Özel hesabına aktarılmıştır. 2022K12-186801 nolu Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerine ait detaylar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Sektörü	DKH- Sosyal-Teknolojik Araştırma
Proje Sahibi	Uşak Üniversitesi
Projeyi Yüklelen Kuruluş	Uşak Üniversitesi
Proje No	2022K12-186801
Karakteristik	Proje Desteği
Proje Başlama Yılı	2022
Proje Bitiş Yılı	2022
Proje Tutarı TL	70.000,00
Kesintili Başlangıç Ödeneği TL	70.000,00
Eklenen TL	0,00
Düşülen TL	0,00
Toplam Ödenek TL	70.000,00
Harcama TL	70.000,00
Kalan Ödenek TL	0,00
Gerçekleşme Oranı (%)	100,00

Yatırım projeleri kapsamında üniversitemiz bünyesinde oluşturulan araştırma/geliştirme temalı laboratuvarlarda, daha modern ve donanımlı cihazlarla çalışma ortamı sağlanması amacıyla, 2022 yılında Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında 6 adet yeni proje desteği verilmiştir. 2022 yılında projeler için sağlanmış olan 3.495.632,00 -TL lik kaynakla Birlikte toplam gelirler Bilimsel Araştırma Projeleri Özel Hesabına aktarılarak önceki yıllardan devam eden ve yıl içinde eklenen projelerin harcamalarında kullanılmıştır. Özgün değeri yüksek ve geliştirilebilir/sürdürülebilir projelere öncelik tanınarak, her geçen gün büyüyen ve başarı sıralamalarında yükselen

üniversitemizin adının başarıyla tanıtılması amaçlanmaktadır.

Bahis projeler kapsamında üniversitemize kazandırılmış makine-teçhizat kalemlerinden çeşitli ürünlerin aşağıda temsili olarak resimleri verilmiştir.



(Analitik Tartı)




(Aşınma ve Boncuklanma Test Cihazı)



(Bilgisayar Destekli Dokuma Tezgahtı)



(Isıtcılı Manyetik Karıştırıcı)

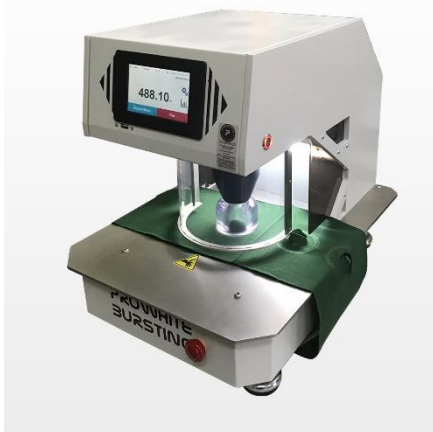

(Kumaş Patlatma Cihazı)



(Döner Buharlaştırıcısı)



(Laboratuvar tipi yatay fulard cihazı)



(Soğutucu Sirkulaör)



(Temas Açısı Test Cihazı)



(Tüp fırın)



(Yırtılma Test Cihazı)



(Yüksek Hassasiyetli Spektrofotometre (UV-DRS))

4- YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE İZLENİP DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN OLARAK ÖNERİLER

- Strateji ve Bütçe Başkanlığınca yatırım bütçe teklifleri hazırlarken üniversitelerin görüşleri dikkate alınarak talebin aynen karşılanması. Verilen ödeneklerin her yıl belli orandaki artışı dikkate alınmadan kurumların öğrenci sayıları, binalarının ve çevrenin fiziki koşulları gözetilerek ödenek dağıtımına gidilmesi, gerektiğinde uzmanlarca yerinde incelemeler yapılarak gerçek ihtiyaç tespitine göre ödenek planlaması yapılması, idaremizce hazırlanan ayrıntılı harcama programı teklifinin Strateji ve Bütçe Başkanlığınca vize aşamasında mümkün olduğu kadar değiştirilmemesi, değişikliklerde idare koşullarının ve gereklerinin dikkate alınması önem arz etmektedir.
- Yatırım teklifleri değerlendirilirken idarelerin stratejik planları ve performans programları da dikkate alınmalıdır.
- AFP’lerde Yatırım Ödeneklerinin Ocak-Şubat aylarına da konularak harcamaya izin verilmesi.
- İhtiyacı karşılayacak sayıda teknik (özellikle mühendis, mimar) ve idari personel için kadro tahsisinin yapılması, KPSS ile bu kadrolara atanacaklar için, kurum tarafından mülakata tabi tutulması nitelikli personel sayısının artması için gereklidir.
- İhale mevzuatında öngörülen ihale sürecinin, ihalenin daha kısa sürede sonuçlanmasına olanak verecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği düşünülmektedir. İhale mevzuatındaki ilan, itiraz vb. sürelerin kısaltılması gerekir. İhale süresinin uzun olması sebebiyle planlanan yatırımlar aksamaktadır.
- Yatırım programının uygulanmasında proje bazında ödenek ve harcamaların takibini sağlamak üzere KBS, E-bütçe, Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi (KAYA) ve Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) programları arasında eşgüdümsele düzenleme yapılmalıdır.

5- UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2021 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

(ARALIK SONU)

Bütçe Türü: Toplam Bütçe

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2021 Sonu Kümülatif Harcama			2022 Yılı Program Ödenek			2022 Yılı Revize Ödenek			2022 Yılı Fiyatlarıyla 2022 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.- Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	6		168.214.100			57.100.00			16.700.000			49.274.100			34.740.393
Sağlık	2		198.200.000			989.799			13.800.000			30.800.000			9.887.384
D.Kamu Hizm.															
-İktisadi															
-Sosyal	2		49.529.000			22.425.000			2.070.000			2.070.000			2.070.000
TOPLAM	10		415.943.100			80.514.799			32.570.000			82.144.100			46.697.777

(*) Genel Bütçe, KİT Bütçesi, Fon, Döner Sermaye, Hibe, Mahalli Katkı gibi Birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her Bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaktır.

6- 2022 YILI HARCAMALARI YATIRIM UYGULAMA RAPORU

Proje No	Proje Adı	Yeri	Karakteristiği	Başlama - Bitiş Yılı	Proje Tutarı	2021 Kümülatif Harcama	Program Ödeneği	Revize Ödenek	Harcama
UŞAK ÜNİ.					415.943.100	80.514.799	32.570.000	82.144.100	46.697.777
EĞİTİM					168.214.100	57.100.000	16.700.000	49.274.100	34.740.393
Yükseköğretim					123.714.100	15.600.000	13.700.000	46.274.100	34.548.820
2008H03-945	Derslik ve Merkezi Birimler	Uşak	Eğitim (13.000 m²)	2008-2024	94.000.000	10.900.000	8.000.000	21.260.000	16.059.130
2008H03-945-151708	Tasarım Merkezi	Uşak	Eğitim (8.000 m²)	2020-2023	42.000.000	10.900.000	8.000.000	16.060.000	16.059.130
2008H03-945-190860	Eşme Meslek Yüksekokulu	Uşak	Eğitim (5.000 m²)	2022-2024	52.000.000	0	-	5.200.000	0
2020H03-151690	Kampüs Altyapısı	Uşak	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı	2020-2022	9.200.000	4.700.000	2.000.000	4.500.000	1.750.377
2020H03-151690-151691	Kampüs Altyapısı	Uşak	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı	2020-2022	9.200.000	4.700.000	2.000.000	4.500.000	0
2022H03-187108	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Uşak	Etüt-Proje	2022-2022	2.140.000	0	200.000	2.140.000	1.331.735
2022H03-187108-187109	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Uşak	Etüt-Proje	2022-2022	2.140.000	0	200.000	2.140.000	0
2022H03-187114	Yayın Alımı	Uşak	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	2022-2022	1.750.000	0	1.000.000	1.750.000	1.739.557
2022H03-187114-187115	Yayın Alımı	Uşak	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	2022-2022	1.750.000	0	1.000.000	1.750.000	0
2022H03-187116	Muhtelif İşler	Uşak	Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat	2022-2022	16.624.100	0	2.500.000	16.624.100	13.668.020
2022H03-187116-187117	Muhtelif İşler	Uşak	Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat	2022-2022	16.624.100	0	2.500.000	16.624.100	0
Beden Eğitimi Ve Spor					44.500.000	41.500.000	3.000.000	3.000.000	191.573
2016H05-41320	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Uşak	Spor Tesisi (7.500 m²), Tribün (5.000 seyirci kapasitesi)	2016-2022	44.500.000	41.500.000	3.000.000	3.000.000	191.573
2016H05-41320-41321	BESYO Kompleksi	Uşak	Spor Tesisi (7.500 m²), Tribün (5.000 seyirci kapasitesi)	2016-2022	44.500.000	41.500.000	3.000.000	3.000.000	191.573
SAĞLIK					198.200.000	989.799	13.800.000	30.800.000	9.887.384
Sağlık					198.200.000	989.799	13.800.000	30.800.000	9.887.384
2021I00-166922	Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi	Uşak	Etüt-Proje, Hastane İnşaatı (15.000 m²)	2021-2025	195.000.000	989.799	10.600.000	27.600.000	6.693.759
2022I00-180009	Muhtelif İşler	Uşak	Makine-Teçhizat	2022-2022	3.200.000	0	3.200.000	3.200.000	3.193.625

2022I00-180009-180010	Makine ve Teçhizat	Uşak	Makine-Teçhizat	2022-2022	3.200.000	0	3.200.000	3.200.000	0
DKH-SOSYAL					49.529.000	22.425.000	2.070.000	2.070.000	2.070.000
Teknolojik Araştırma					49.529.000	22.425.000	2.070.000	2.070.000	2.070.000
2017K12-40721	İhtisaslaşma Projesi	Uşak	Bakım Onarım, Basılı Yayın Alımı, BİT, Elektronik Yayın Alımı, Etüt-Proje, Müşavirlik, Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma	2017-2023	49.459.000	22.425.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
2017K12-40721-40731	Deri, Tekstil ve Seramik Sekt. İhtisaslaşma Projesi	Uşak	Bakım Onarım, Basılı Yayın Alımı, BİT, Elektronik Yayın Alımı, Etüt-Proje, Müşavirlik, Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma	2017-2023	49.459.000	22.425.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
2022K12-186801	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	Uşak	Proje Desteği	2022-2022	70.000	0	70.000	70.000	70.000
Genel Toplam					415.943.100	80.514.799	32.570.000	82.144.100	46.697.777

Not: Yatırım programında yer alan tüm projeler için kamulaştırma ödeneği hariç tutularak dış kredi, sermaye transferi, borç verme, döner sermaye, hibe, vb. diğer tüm ödeneklere dair harcama bilgileri listelenmektedir.
